




# **МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

*22 мая 2022 г.*


В республике в соответствии с планом продолжается реализация республиканских программ строительства, обеспечения жильем, государственных программ и Национальных проектов.

# ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

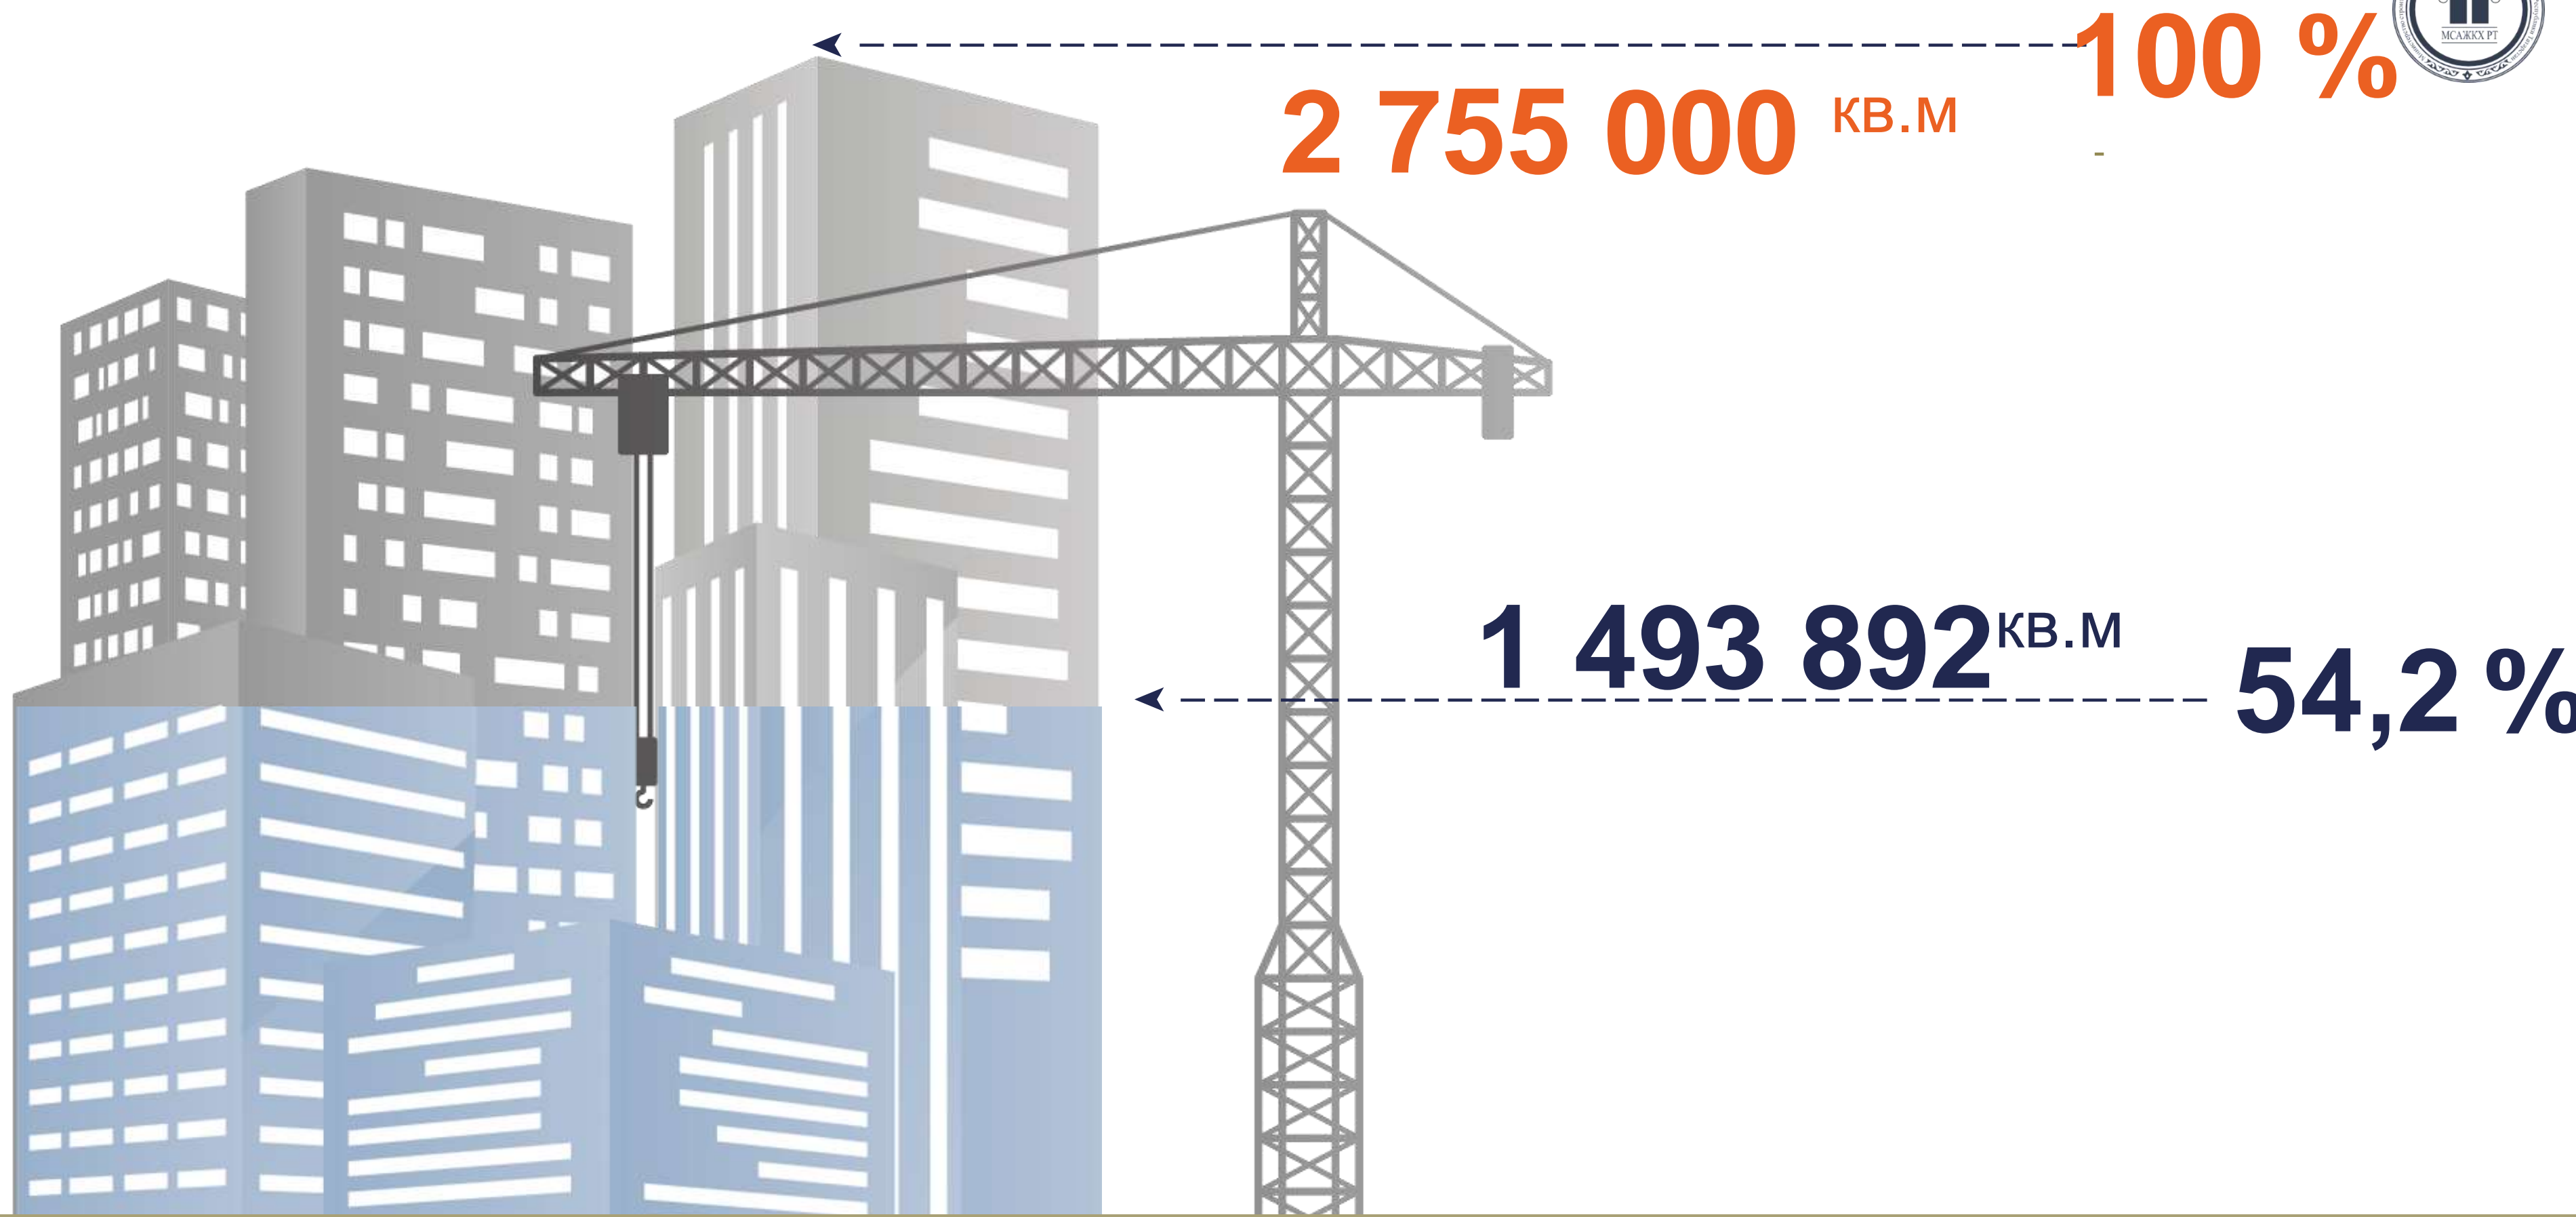

Сегодня начать свой доклад хотел бы с положения дел в жилищном строительстве, которое набрало хороший темп - к настоящему времени сдано 1 миллион 494 тысячи квадратных метров, что составляет 54 % от годового плана.

# ПРОГРАММА ГЖФ РТ

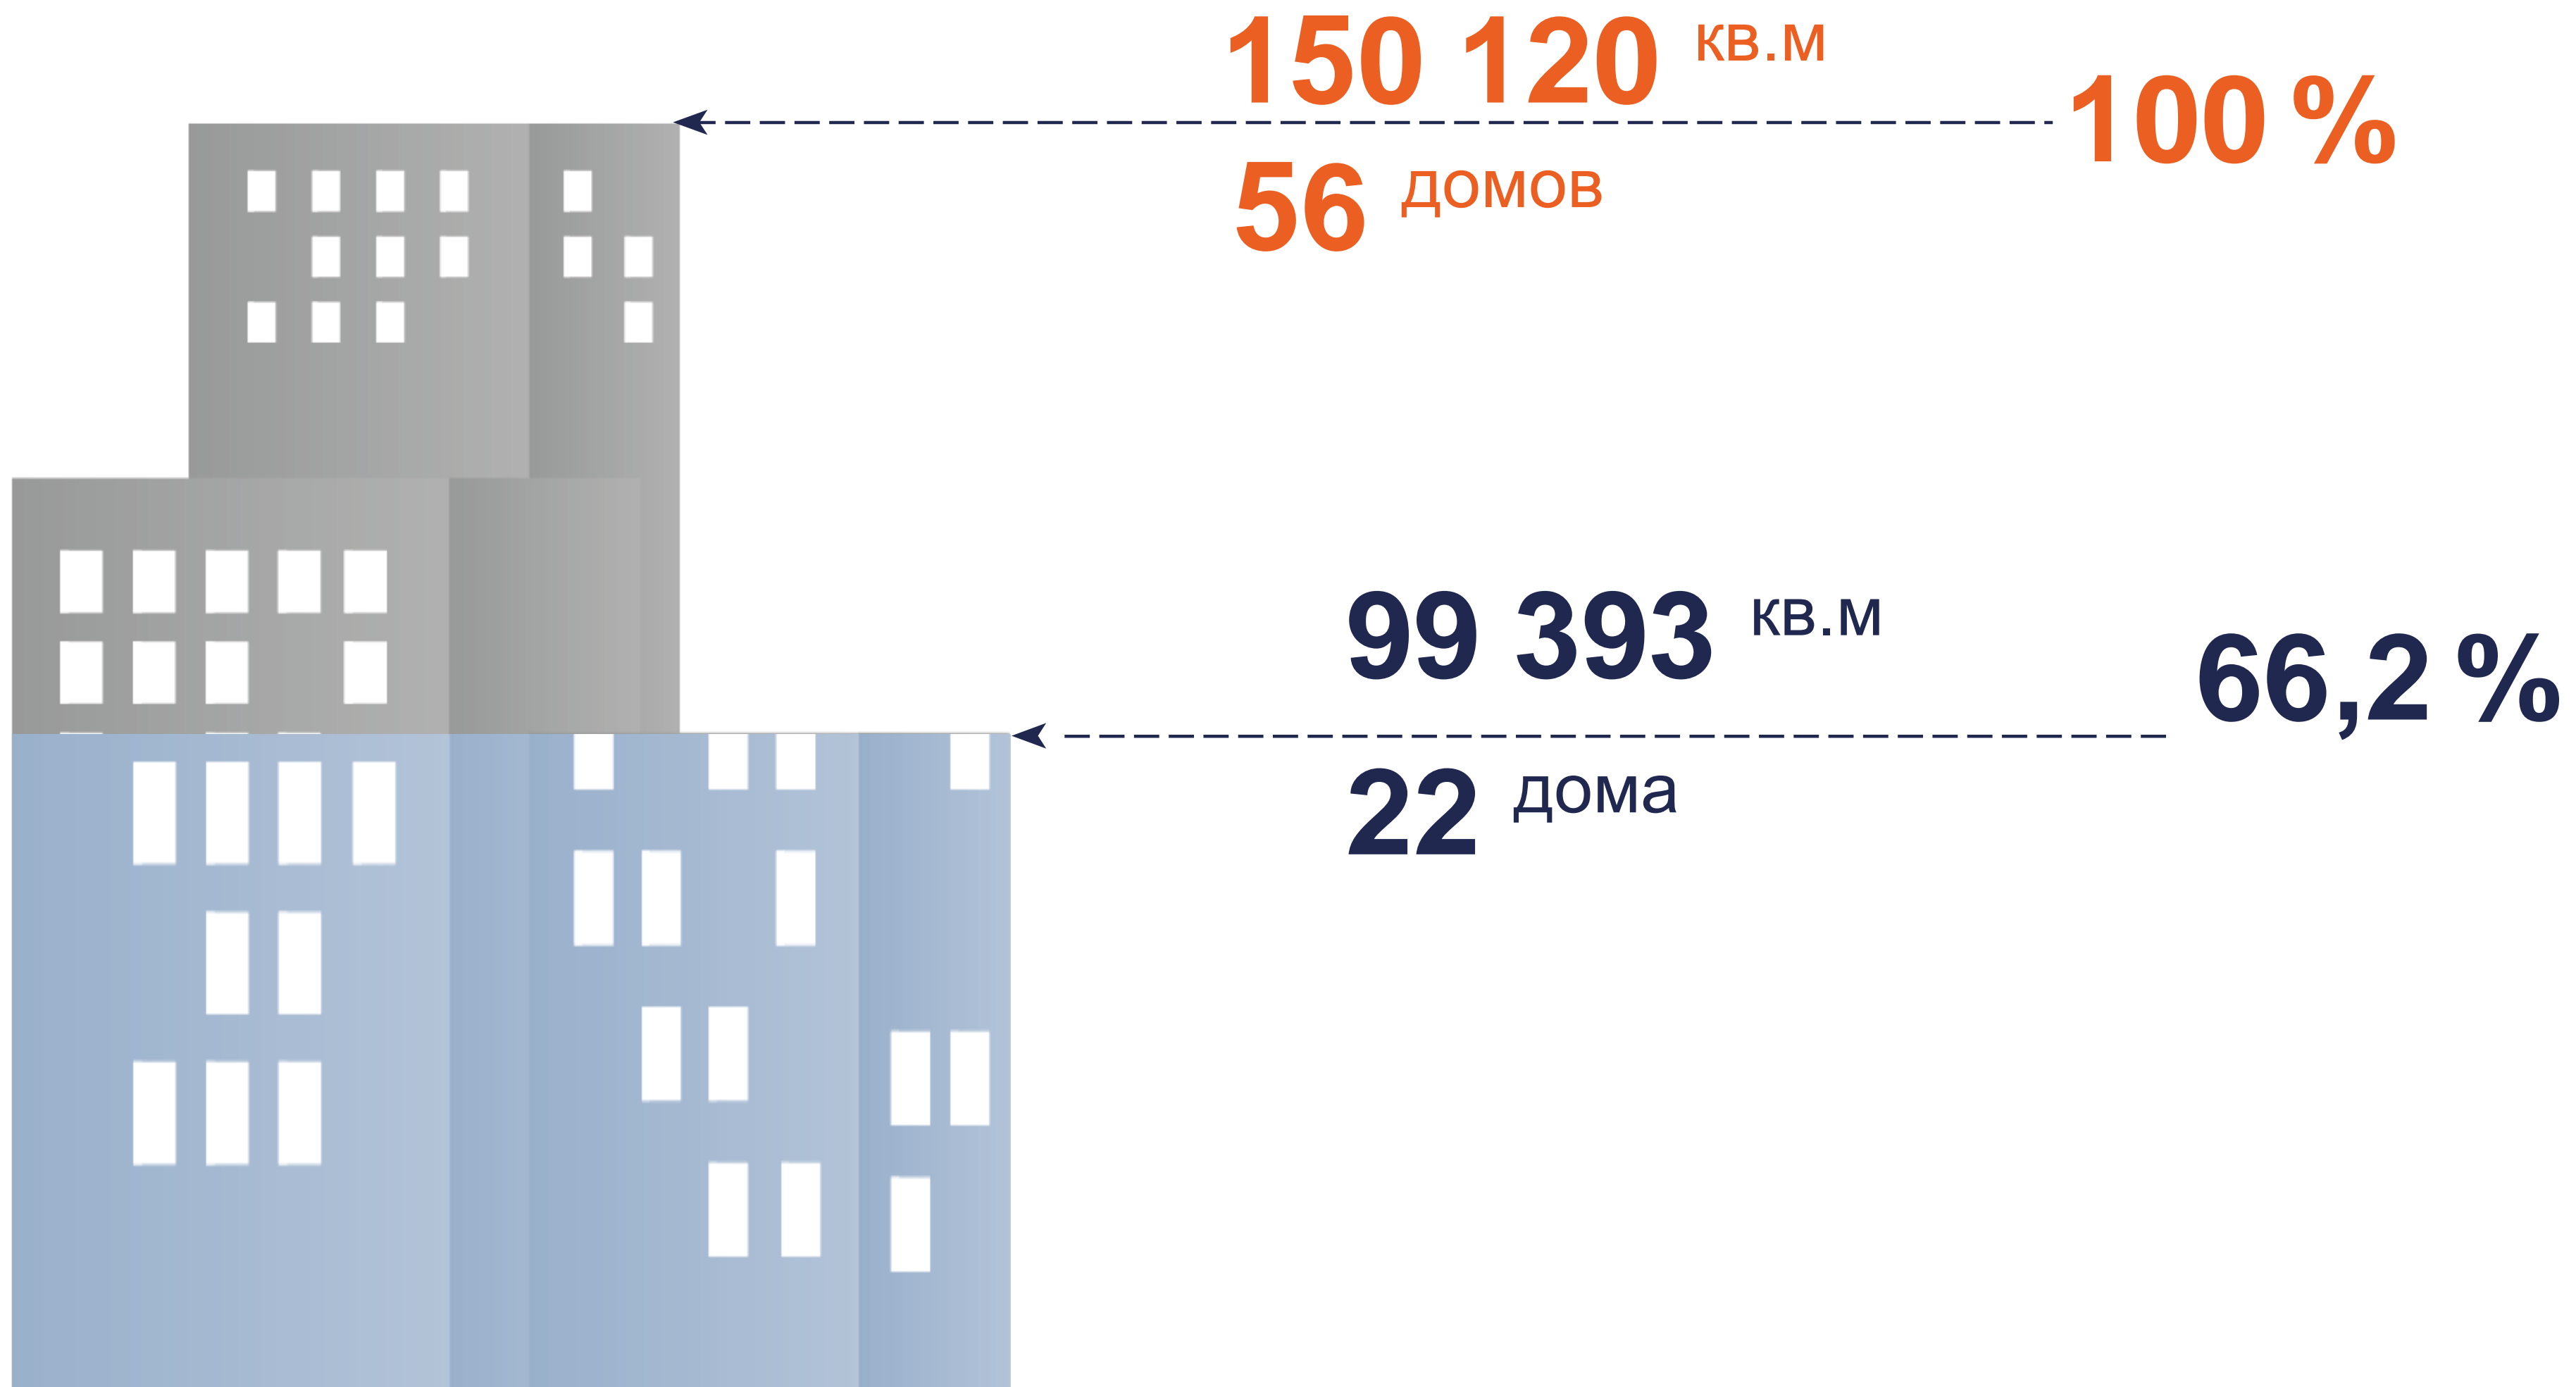



# ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



**1 681 296** КВ.М  
**12 454** дома  
**100 %**

**935 536** КВ.М  
**6 930** ДОМОВ  
**55,6 %**

# МНОГОКВАРТИРНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЕ



**923 584** КВ.М  
**148** ДОМОВ  
**100 %**

**458 936** КВ.М  
**63** ДОМОВ  
**42,5 %**

# УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ НА 2022 ГОД



	ПЛАН, КВАРТИР	ЛИМИТ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РФ, МЛН.РУБ.	БЮДЖЕТ РТ, МЛН.РУБ.
ДЕТИ-СИРОТЫ	600	959,64	56,08	903,56
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ	25	229,18	-	229,18
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ	50	67,29	17,79	49,50

## ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

ИТОГО СЕМЕЙ, В Т.Ч. ПО КАТЕГОРИЯМ:	5	23,64	23,64	-
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ	3	18,29	18,29	-
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ	1	2,91	2,91	-
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА	1	2,44	2,44	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>680</b>	<b>1 279,75</b>	<b>97,51</b>	<b>1 182,24</b>



# МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



№	МО РТ	ОФОРМЛЕНО СЕРТИФИКАТОВ	РЕАЛИЗОВАНО СЕРТИФИКАТОВ
1	Арский	1	1
2	Тукаевский	1	1
3	Альметьевский	2	2
4	Мамадышский	1	1
5	Лениногорский	2	1
6	Аксубаевский	2	0
7	Балтасинский	4	0
8	Высокогорский	1	0
9	Елабужский	1	0
10	Кукморский	1	0
11	Лаишевский	1	0
12	Мензелинский	2	0
13	Рыбно-Слободский	2	0
14	г.Казань	3	0
15	г.Набережные Челны	1	0
<b>ИТОГО ПО РТ:</b>		<b>25</b>	<b>6</b>

# МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

№	МО РТ	Кол-во семей
1	Азнакаевский	2
2	Алексеевский	1
3	Апастовский	1
4	Арский	2
5	Бавлинский	3
6	Балтасинский	2
7	Бугульминский	1
8	Буинский	1
9	Высокогорский	1
10	Дрожжановский	1
11	Елабужский	1
12	Зеленодольский	3

№	МО РТ	Кол-во семей
13	Мамадышский	1
14	Нижнекамский	3
15	Нурлатский	1
16	Пестречинский	1
17	Сабинский	2
18	Черемшанский	1
19	Чистопольский	1
20	Ютазинский	1
21	г.Набережные Челны	6
22	г.Казань	14
<b>ИТОГО ПО РТ:</b>		<b>50</b>



# ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ **ГРАЖДАН**

№	МО РТ	Количество получателей	Оформлено сертификатов
<b>1</b>	<b>УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1.1	Г.Казань	1	1
1.2	Кукморский	1	1
1.3	Пестречинский	1	1
<b>2</b>	<b>ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.1	г.Казань	1	1
<b>3</b>	<b>ВЫЕХАВШИЕ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
3.1	г.Казань	1	0
<b>ВСЕГО ПО РТ</b>		<b>5</b>	<b>4</b>

# СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛЯНОЙ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЗДАНИЕМ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Тугарова	75 905,61	2,00	0,00
2	Мензелинский муниципальный район, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля	75 905,61	6,00	3,00
3	Высокогорский муниципальный район, с.Высокая Гора, ул.Стадионная	75 905,61	7,00	0,00
4	Буинский муниципальный район, г.Буинск, ул.Школьная	75 905,61	7,00	0,00
5	Нурлатский муниципальный район, с.Средняя Камышла, ул.А.Волкова	75 905,61	9,00	4,00
6	Мамадышский муниципальный район, г.Мамадыш, ул.Давыдова	75 905,61	23,00	8,00
<b>ИТОГО</b>		<b>455 433,69</b>	<b>9,00</b>	<b>2,50</b>



# СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТЫХ ФУТБОЛЬНЫХ МАНЕЖЕЙ С КАРКАСНО-ТЕНТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И ФУТБОЛЬНОЙ ПОЛЯНОЙ РАЗМЕРОМ 20-40 МЕТРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ

## МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН





# СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНЫХ МОДУЛЬНЫХ ЛЫЖНЫХ БАЗ С МЕБЕЛЬЮ, ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство блочной модульной лыжной базы с мебелью, инвентарем и оборудованием в Камско-Устьинском муниципальном районе, пгт.Камское Устье, ул.Сары Садыковой	11 879,22	25,00	10,00





# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Административное здание с ИВС межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории	149 250,00	22,00	3,00





# СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (СОВЕТОВ) ПОСЕЛЕНИЙ



№	МО РТ	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Атнинский, Узюмское СП, с.Таш-Чишма, ул.Ш.Усманова, д.1б	7 237,80	2,00	1,00
2	Новошешминский, Петропавловское СП, с.Слобода Петропавловская, ул.Ленина	7 237,80	18,00	3,00
3	Менделеевский, Тойгузинское СП, д.Тойгузино, пер.Школьный	7 237,80	18,00	1,00
4	Сармановский, Новоимянское СП, с.Кутемели, ул.Гагарина, д.23	7 237,80	25,00	7,00
5	Нижнекамский, Нижнеуратьминское СП, с.Нижняя Уратьма	7 237,80	33,00	13,00
6	Нурлатский, Якушкинское СП, с.Якушкино, ул.Ленина	7 237,80	35,00	7,00
7	Алексеевский, Ялкынское СП, д.Ялкын, ул.Зеленая, д.35	7 237,80	40,00	2,00
8	Верхнеуслонский, Верхнеуслонское СП, с.Верхний Услон, ул.Чехова	7 237,80	60,00	10,00
9	Елабужский, Костенеевское СП, с.Костенеево, ул.Центральная	7 237,80	65,00	10,00
<b>ИТОГО</b>		<b>65 140,20</b>	<b>32,89</b>	<b>6,00</b>



# СТРОИТЕЛЬСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ РАЙОН





# СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР,%	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1	84 328,70	42,00	2,00





# РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.	
<b>НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»</b> <i>37 объектов</i>	1. ФП «Жилье»	1 Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	29 060,00	
		1 Реконструкция очистных сооружений (переходящий объект с 2021 года)	140 804,81	
		1 Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе «Замелекесье» (продолжение улицы Ш-1Ж)	38 555,68	
	2. ФП «Формирование комфортной городской среды»	27 (парки, скверы)	1 518 622,39	
		6 (конкурс малых городов 2022 г.)	395 062,50	
		3. ФП «Чистая вода»	1 (строительство системы водоснабж..)	279 081,36
		4. ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	12,517 тыс. кв. метров	82 895,27
<b>НП «ЭКОЛОГИЯ»</b> <i>3 объекта</i>	5. ФП «Оздоровление волги»	1 Реконструкция БОСК г.Казань	1 855 062,22	
		1 Рекультивация иловых полей	3 300 814,69	
	6. ФП «Чистая страна»	1 Рекультивация Самосыровского полигона	200 000,00	
<b>НП «ЗДРАВООХРА- НЕНИЕ»</b> <i>49 объектов</i>	7. ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения»	49 (строительство и реконструкция: АПУ, ВОП, ВА, ФАП ,капитальный ремонт поликлиник и врачебных амбулаторий)	1 377 248,06	
<b>ИТОГО</b>		<b>12</b>	<b>105</b>	<b>10 651 630,23</b>



# РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2022 ГОД



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
НП «КУЛЬТУРА» 11 объектов	8. ФП «Культурная среда»	2 (капитальный ремонт дома культуры)	70 000,00
		2 (капитальный ремонт детских музыкальных школ и музеев)	49 616,14
		1 (реконструкция театра юного зрителя)	352 969,60
		5 (строительство сельских домов культуры)	114 926,73
		1 (Реконструкция районного дома культуры)	405 550,00
НП «ДЕМОГРАФИЯ» 1 объект	9. ФП «Содействие занятости»	1 (строительство детских садов)	71 986,30
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 3 объекта	10. ФП «Современная школа»	1 (строительство школы)	123 347,17
	11. ФП «Успех каждого ребенка»	2 (капремонт спорт.залов)	2 914,20
НП «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 1 объект	12. ФП «Развитие туристической инфраструктуры»	Благоустройство территории вблизи объекта "Тюбетей тауер"	243 113,10
<b>ИТОГО</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>10 651 630,23</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР,%	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Мамадышский	Набережная р.Вятки, 3 очередь	22 268,58	1,00	1,00
2	Менделеевский	Бульвар Интернационалистов, 2 очередь	16 053,53	1,00	1,00
3	Азнакаевский	Набережная р.Черной, 2 очередь	31 921,48	1,00	1,00
4	Елабужский	Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул.Марджани, 2 очередь	41 721,31	1,00	1,00
5	Кукморский	Набережная р.Нурминки, 3 очередь	77 610,00	2,00	2,00
6	Пестречинский	Детский городок, 2 очередь	26 653,80	2,00	1,00
7	Тюлячинский	Пруд в с.Баландыш, 2 очередь	4 975,00	2,00	2,00
8	Арский	Площадь Советская и ул.Большая, 5 очередь	19 900,00	3,00	3,00
9	Муслюмовский	Парк Спортивный, 2 очередь	10 332,99	3,00	3,00
10	Черемшанский	Улица Советская, 2 очередь	9 929,37	3,00	3,00
<b>ИТОГО из 27:</b>			<b>1 436 830,733</b>	<b>11,90</b>	<b>3,48</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»




№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР,%	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
11	Нижнекамский	Экстрим-парк, 2 очередь	47 760,00	3,00	3,00
12	Чистопольский	Центральная площадь, 2 очередь	40 411,65	5,00	5,00
13	Буинский	Центральная площадь, 3 очередь	71 799,99	8,00	8,00
14	Лениногорский	Парк «Мэхэббэт», 2 очередь	43 410,16	9,00	5,00
15	Актанышский	Благоустройство набережной оз.Иске Идель	26 959,32	10,00	5,00
16	Нижнекамский	Школьный бульвар, 2 очередь	19 900,00	10,00	5,00
17	Альметьевский	Бульвар по ул.Ризы Фахретдина, (от ул.Ленина до ул.Советской), 2 очередь	56 305,57	15,00	15,00
18	Нурлатский	Парк «Кондурча», 2 очередь	29 441,84	15,00	8,00
19	Альметьевский	Внутриквартальный бульвар мкр.Западные Ворота (от ул.Гафиатуллина до ул.Бигаш), 2 очередь	56 305,57	20,00	20,00
20	г.Казань	Парк у жилого комплекса «Салават Купере», 2 очередь	498 036,44	25,00	2,00
<b>ИТОГО из 27:</b>			<b>1 436 830,733</b>	<b>11,90</b>	<b>3,48</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



## ПАРК У ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «САЛАВАТ КУПЕРЕ», 2 ОЧЕРЕДЬ

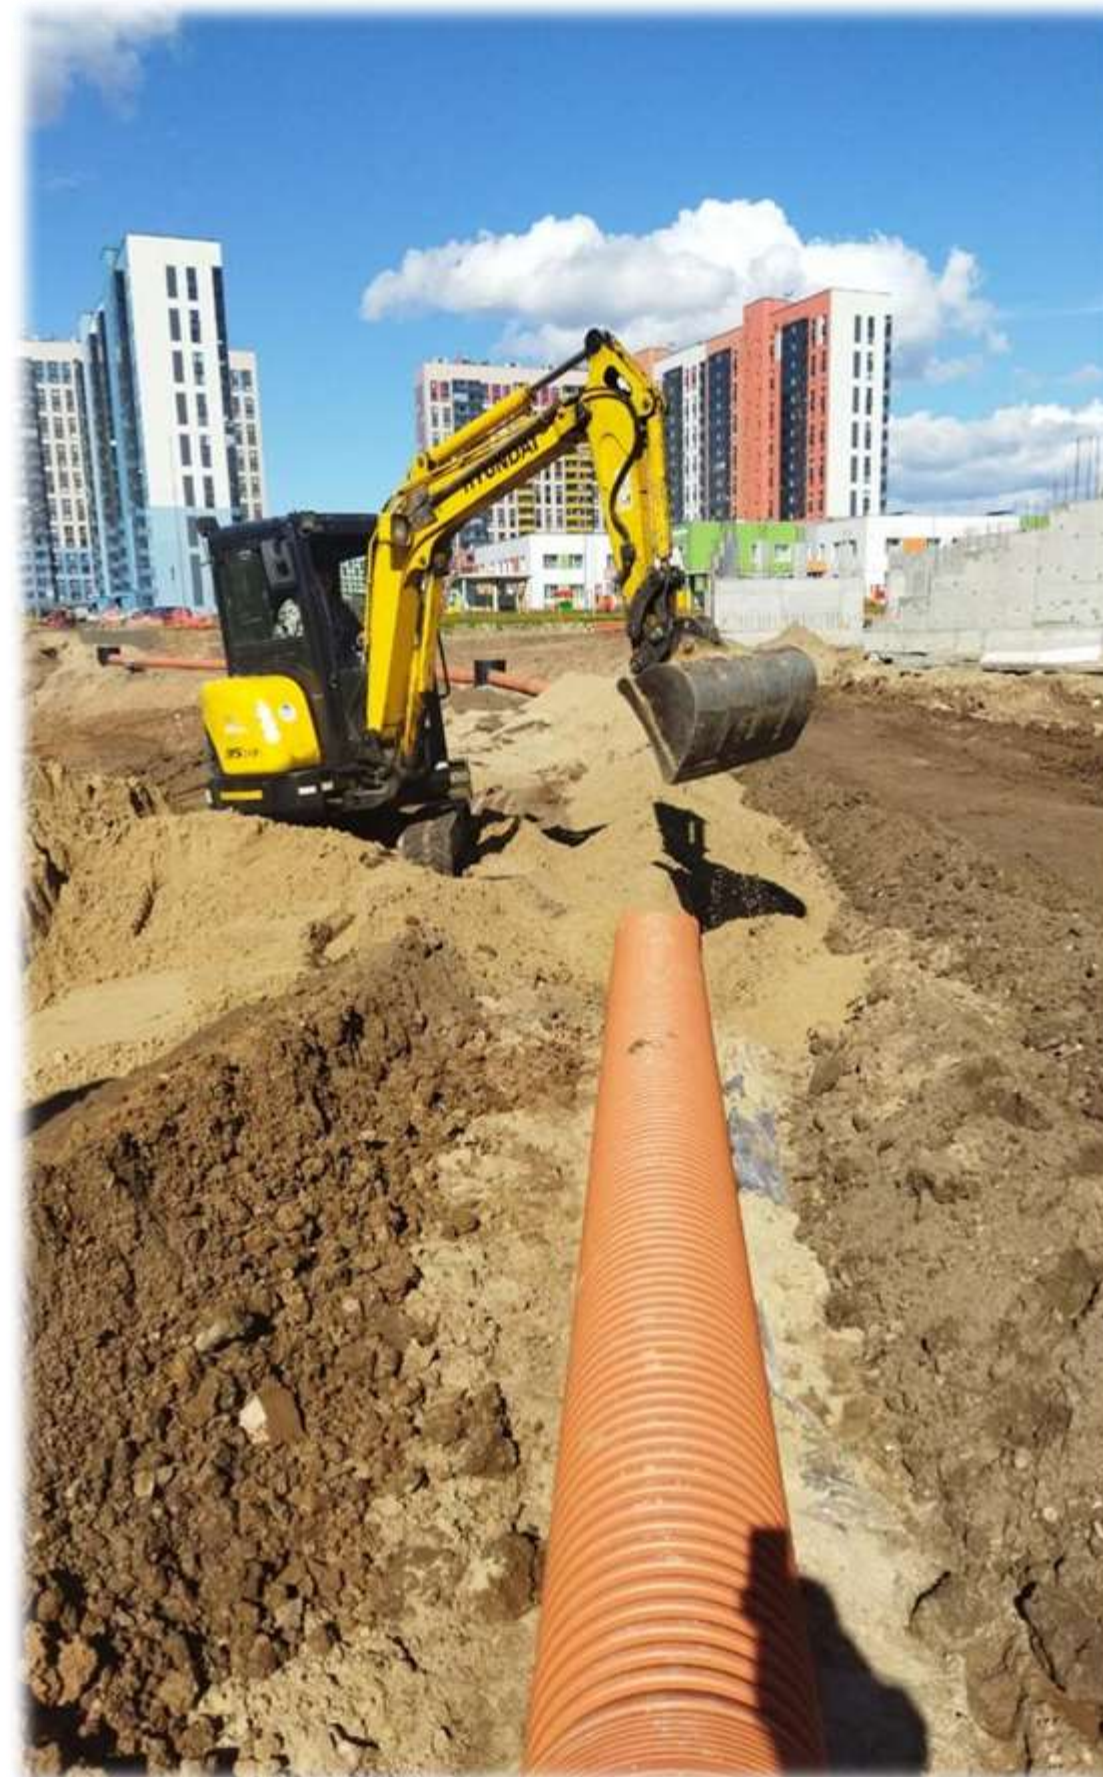



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**  
**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ**  
**КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**  
**ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ БУЛЬВАР МКР.ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА**  
**АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН**





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

## КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ 2022



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР,%	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Алексеевский	Культурно-рекреационный кластер "Алтын Дага", с.Билярск	55 968,75	0,00	0,00
2	Кукморский	Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц – Ворошилова и Ленина, г.Кукмор	49 750,00	0,00	0,00
3	Агрызский	Благоустройство улицы Карла Маркса, г.Агрыз	49 750,00	2,00	2,00
4	Бавлинский	Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы», г.Бавлы	69 650,00	2,00	2,00
5	Арский	ТатАрские предания - в город старой дорогой по ул.Коммуны, г.Арск	69 650,00	5,00	4,00
6	Чистопольский	Городская набережная реки Кама "Наречье", г.Чистополь	79 600,00	6,00	3,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>374 368,75</b>	<b>2,84</b>	<b>1,83</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ 2022

## ТАТАРСКИЕ ПРЕДАНИЯ - В ГОРОД СТАРОЙ ДОРОГОЙ ПО УЛ.КОММУНЫ, Г.АРСК





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ»



№	МО	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР,%
1	г. Набережные Челны	Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная в жилом районе Замелекесье (продолжение улицы Ш-1Ж)	38 362,90	1,00
2	г.Казань	Обустройство перекрестка на пересечении улицы Родины и улицы Аделя Кутуя с размещением светофорного объекта	28 914,70	1,50
3	Пестречинский	Реконструкция очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в жилом комплексе "Усадьба Царево", с увеличением производительности от 2500 куб.м/сут до 4000 куб.м/сут	140 100,79	Всего – 59,29 (За 2022г. – 31,26)
<b>ИТОГО:</b>			<b>207 378,39</b>	<b>11,25</b>



# РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «УСАДЬБА ЦАРЕВО»





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом, Нурлатский район	277 714,63	15,00	9,00





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»



Этап Программы	Год реализации	Человек	Кол-во помещений, ед.	Общая площадь, кв.м.
<b>Всего факт на 2022 год</b>		<b>444</b>	<b>192</b>	<b>5 213,12</b>
<b>Всего план на 2022 год</b>		<b>841</b>	<b>324</b>	<b>9 626,99</b>
<b>Этап 2021 года (срок реализации 2021-2022гг)</b>	<b>Всего</b>	<b>294</b>	<b>100</b>	<b>3 772,19</b>
	2021 год (план-факт)	216	79	2 945,36
	2022 год (план)	78	21	826,83
	2022 год (факт)	29	10	394,33
<b>Этап 2022 года (срок реализации 2022-2023гг)</b>	<b>Всего</b>	<b>988</b>	<b>403</b>	<b>12 517,71</b>
	2022 год (план)	763	303	8 800,16
	2022 год (факт)	415	182	4 818,79
	2023 год (план)	225	100	3717,55



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Реконструкция БОС г.Казани	1 855 062,22	31,25	0,19





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Рекультивация иловых полей, г. Казань	3 300 814,69	8,77	0,15





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР, %	
			ФАКТ, %	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Рекультивация Самосыровского полигона г. Казани	872 158,72	36,44	0,02





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ,%	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство общеобразовательной организации на 100 мест в с.Шильнебаш, Тукаевский район	123 347,17	11,00	2,00





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО</b>				
1	Строительство центра ВОП и педиатра в г.Альметьевске	49 671,05	0,00	0,00
2	Врачебная амбулатория ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница" Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, с.Куюки	203 516,17	8,00	2,00
3	Многопрофильная поликлиника (взрослое и детское население) ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" Зеленодольский муниципальный район, с. Осиново	226 501,66	11,00	3,00
4	Филиал детской поликлиники ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6" г. Казань, пос.Дербышки	380 845,94	15,00	4,00
5	Мусабай-Заводский ФАП ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница"	8 149,41	15,00	3,00
6	Старо-Кувакская ВА ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	26 171,32	15,00	0,75
7	Сухояшевский ФАП ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
8	Краснобаранский ФАП ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
9	Чуру-Барышевский ФАП ГАУЗ "Апастовская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
10	Потапово-Тумбарлинский ФАП ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
11	Бурнакский ФАП ГАУЗ "Балтасинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 077 386,54</b>	<b>13,78</b>	<b>5,23</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО</b>				
12	Прогресский ФАП ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
13	Октябрьский ФАП ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
14	Дачный ФАП ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
15	Новоспасский ФАП ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
16	Больше-Ходяшевский ФАП ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
17	Чутеевский ФАП ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
18	Азимово-Курлибашский ФАП ГАУЗ "Камско- Устьинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
19	Нижнесуньский ФАП ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
20	Залесный ФАП ГАУЗ "Городская поликлиника №7", г. Набережные Челны	8 149,41	15,00	0,00
21	Слобода-Екатерининский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
22	Красно-Октябрьский ФАП ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
<b>ИТОГО :</b>		<b>1 077 386,54</b>	<b>13,78</b>	<b>5,23</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО</b>				
23	Бердибяковский ФАП ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
24	Сарайлинский ФАП ГАУЗ "Сармановская центральная районная больница"	5 006,48	15,00	0,00
25	Нижне-Кондратинский ФАП ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	0,00
26	Актанышбашский ФАП ГАУЗ "Актанышская центральная районная больница"	6 732,91	15,10	0,10
27	Молодежный ФАП ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	8 149,41	15,00	0,00
28	Юртовский ФАП ГАУЗ "Мензелинская центральная районная больница"	6 732,91	15,00	15,00
29	Верхне-Уратьминский ФАП ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница"	8 149,41	15,00	15,00
30	Ново-Иглайкинский ФАП ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница"	6 732,91	33,00	18,00
31	Юлбатский ФАП ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница"	6 732,91	51,50	36,50
32	Урнякский ФАП ГАУЗ "Арская центральная районная больница"	8 149,41	62,50	44,50
33	Аланский ФАП ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница"	6 732,91	99,00	28,75
34	Тимяшевский ФАП ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница"	8 149,41	100,00	2,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 077 386,54</b>	<b>13,78</b>	<b>5,23</b>



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» **ТИМЯШЕВСКИЙ ФАП ГАУЗ «ЛЕНИНОГОРСКАЯ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»**





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>				
1	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", поликлиника (корпус № 3), г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52	298,50	0,00	0,00
2	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", поликлиника, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.Ленина, д.35, корпус А	45 203,68	18,00	6,00
3	ГАУЗ "Кукморская центральная районная больница", поликлиника, г. Кукмор, ул. Ворошилова, д. 24	12 383,33	19,00	6,00
4	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", здание поликлиники медико-санитарной части, г.Лениногорск, ул.Горького д.36, строение 1	20 069,43	26,00	4,00
5	ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница", врачебная амбулатория (гериатрическое отделение), Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Горького, д.4, строение 2	50 759,92	26,00	4,00
6	ГАУЗ "Заинская центральная районная больница", женская консультация (корпус №1), г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52	5 136,29	30,00	5,00
7	ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная больница", поликлиника, Аксубаевский район, п.г.т.Аксубаево, ул.Мазилина, д.41	30 147,11	32,00	9,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>202 026,87</b>	<b>37,07</b>	<b>6,53</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС. РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>				
8	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", поликлиника, Алексеевский район, п.г.т.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85	10 413,60	43,00	7,00
9	ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница", клинично-диагностическая поликлиника, Алексеевский район, пгт.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85	14 966,93	47,00	5,00
10	ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница", поликлиника, г.Мамадыш, ул.Ленина, д.105	23 066,04	55,00	10,00
11	ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница", поликлиника №1, г.Зеленодольск, ул.Энгельса д.25	13 930,28	60,00	32,00
12	ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница", поликлиника, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Медицинский городок, д. 21	11 243,72	95,00	5,00
13	ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница", детская поликлиника, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.Ленина, д.35, корпус Б	6 727,82	95,00	5,00
14	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", женская консультация, Кайбицкий район, с. Б.Кайбицы ул. Гисматуллина д.1	907,13	100,00	0,00
15	ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница", поликлиника, Кайбицкий район, с. Б.Кайбицы ул. Гисматуллина д.1	464,47	100,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>202 026,87</b>	<b>37,07</b>	<b>6,53</b>



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»**



**ГАУЗ «ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»,  
ПОЛИКЛИНИКА, ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ РАЙОН**





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО</b>				
1	Строительство сельского дома культуры в д.Уба, Бавлинский район	12 323,73	4,00	1,00
2	Строительство культурно-досугового центра с.Катмыш, Мамадышский район	34 520,39	6,00	4,00
3	Строительство сельского дома культуры в п.Октябрьский, Зеленодольский район	34 520,39	12,00	5,00
4	Строительство многофункционального центра в д.Старая Задоровка, Дрожжановский район	12 323,73	20,00	5,00
5	Строительство сельского дома культуры в с.Штырь, Арский район	12 323,73	24,00	6,00
<b>ИТОГО :</b>		<b>106 011,97</b>	<b>11,44</b>	<b>4,20</b>



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>				
6	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Лаишевского края имени Г.Р.Державина»	29 697,14	20,00	8,00
7	Здание муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Арская детская школа искусств»	19 819,40	37,00	1,00
8	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Байлянгар, Кукморский район	35 000,00	60,00	6,00
9	Капитальный ремонт Сельский дом культуры в с. Ядыгерь, Кукморский район	35 000,00	62,00	6,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>119 516,55</b>	<b>46,83</b>	<b>5,25</b>
<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ</b>				
11	Реконструкция Районного дома культуры в г.Буинск	403 522,25	4,00	1,00
10	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения Театр юного зрителя города Нижнекамска	351 204,75	12,00	3,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>754 727,00</b>	<b>7,72</b>	<b>2,00</b>



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»**



**СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В С.ШТЫРЬ, АРСКИЙ РАЙОН**





# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
<b>ГП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»</b> <i>16 объектов</i>	ФП «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	7 (комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку)	95 487,3
	ФП «Современный облик сельских территорий»	3 (строительство 3 школ)	478 372,35
		6 (капитальный ремонт объектов комплексного обустройства)	176 261,7
<b>ГП «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019-2024 ГОДЫ»</b> <i>4 объекта</i>	ФП «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности»	4 объекта восстановления воинских захоронений	12 397,00
<b>ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»</b> <i>1 объект</i>	ФП «Сохранение культурного и исторического наследия»	1 (Строительство Русского драматического театра "Мастеровые")	897 268,50
<b>ИТОГО</b>		<b>104</b>	<b>5 834 743,59</b>



# РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
<b>ГП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»</b> <i>66 объектов</i>	Капитальный ремонт школ	66 объектов капитального ремонта школ	3 798 036,67
<b>ГП «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»</b> <i>15 объектов</i>	ФП «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	15 объектов (1- Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Камское Устье РТ и 14 объектов Кап.ремонт гидротехнических сооружений)	233 940,10
<b>ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»</b> <i>2 объект</i>	ФП «Бизнес-спринт»	Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок	133 333,33
<b>ИТОГО</b>		<b>104</b>	<b>5 834 743,59</b>



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ	СМР,%	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство Русского драматического театра "Мастеровые" г.Набережные Челны	1 794 536,50	68,00	2,00





# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»



## СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство школы-сада на 240/120 мест г.Мамадыш	223 909,14	34,00	8,00
2	Строительство школы на 500 мест в н.п.Богатые Сабы	211 347,83	38,82	0,69
3	Капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Олуяз, Кукморский район	46 561,45	40,00	7,00
4	Строительство начальной школы на 15 мест в н.п.Балыклы, Кукморский район	41 843,07	40,00	5,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>523 661,48</b>	<b>36,74</b>	<b>5,17</b>



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В С.ОЛУЯЗ, КУКМОРСКИЙ РАЙОН





# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

## СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Строительство водонапорных сооружений и прилегающих к ним инженерных сетей в с.Олуяз, Кукморский район	13 337,67	2,00	2,00
2	Строительство сетей водоснабжения в н.п.Балыклы, Кукморский район	39 474,84	15,00	8,00
4	Строительство линии канализации и теплотрассы по ул.Советской, Мамадышский район	13 114,10	40,00	20,00
3	Строительство системы газоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	45 683,64	40,00	20,00
5	Строительство системы водоснабжения жилых домов, расположенных в восточной части г.Лаишево	17 208,71	75,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>128 818,96</b>	<b>32,91</b>	<b>4,51</b>



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»



**Строительство сетей водоснабжения в  
н.п.Балыклы, Кукморский район**



**Строительство водонапорных сооружений и  
прилегающих к ним инженерных сетей в с.Олуяз,  
Кукморский район**



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ



№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ
1	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Новотроицкое" на 636 домов (газоснабжение), Тукаевский район	363,854
2	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку на 127 жилых домов в д.Балыклы) (автомобильная дорога),Кукморский район	12 283,95
3	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 268 жилых домов в н.п. Песчаные Ковали (автомобильная дорога), Лаишевский район	18 425,93
4	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 150 жилых домов в с.Конь (дорога), Пестречинский район	5 830,33
5	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку на 25 жилых домов в н.п.Богатые Сабы(благоустройство)	12 283,95
6	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с.Новотроицкое жилого микрорайона «Энергия» на 636 домов (благоустройство), Тукаевский район	11 925,96
7	Комплексное обустройство площадки под компактную жилую застройку на 256 домов в микрорайоне «Южный с.Черемшан (автомобильная дорога), Черемшанский район	33 901,74
<b>ИТОГО:</b>		<b>95 015,71</b>



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
			ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Мичанбаш, Сабинский МР	7 659,73	2,00	0,00
2	Капитальный ремонт ГТС пруда у д.Садилово, Высокогорский МР	7 659,73	3,00	2,00
3	Капитальный ремонт ГТС пруда у п.Ушня, Пестречинский МР	7 659,73	3,00	1,00
4	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Каргали, Чистопольский МР	7 659,73	10,00	6,00
5	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Татарский Дюм-Дюм, Елабужский МР	7 659,73	15,00	11,00
6	Капитальный ремонт ГТС пруда у с.Атиаз, Елабужский МР	7 659,73	15,00	11,00
7	Капитальный ремонт ГТС в районе ул.Москвина и Луговая в г.Мамадыш, Мамадышский МР	7 659,73	75,00	3,00
<b>ИТОГО из 14:</b>		<b>107 236,32</b>	<b>8,79</b>	<b>2,43</b>



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ПРУДА У С.ТАТАРСКИЙ ДЮМ-ДЮМ, ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН





# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ»



<b>№</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА</b>	<b>ЛИМИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ</b>
1	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища с .Камское –Устье	126 164,90



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
1	г.Казань	3	209 857,61	9,16	2,57
2	Рыбно-Слободский	1	39 041,81	12,00	4,00
3	Спасский	2	151 146,64	19,00	2,00
4	Мензелинский	2	84 650,12	26,49	6,92
5	Нурлатский	5	252 129,52	30,60	6,24
6	Новошешминский	3	150 667,21	31,49	8,29
7	Зеленодольский	2	251 273,32	34,99	4,49
8	Альметьевский	14	564 178,76	35,14	7,59
9	Лаишевский	1	71 927,22	35,14	12,00
10	Кукморский	2	170 579,65	35,91	6,71
<b>ИТОГО:</b>		<b>66</b>	<b>3 779 046,48</b>	<b>35,98</b>	<b>7,08</b>



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



№	МО	КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	СУММА ПО ГК, ТЫС.РУБЛЕЙ	СМР, %	
				ФАКТ	ДИНАМИКА ЗА 2 НЕДЕЛИ
11	Алексеевский	2	140 791,67	36,35	6,82
12	Нижнекамский	7	537 390,05	37,99	6,14
13	Черемшанский	2	126 438,96	38,00	7,78
14	Ютазинский	5	273 447,06	40,00	14,92
15	Мамадышский	3	179 496,34	40,00	8,00
16	Кайбицкий	1	63 816,81	42,16	4,00
17	Агрызский	3	124 415,46	45,17	5,89
18	Муслюмовский	1	28 832,12	55,17	18,00
19	Апастовский	5	284 672,49	58,00	7,51
20	Дрожжановский	2	74 293,67	65,88	7,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>66</b>	<b>3 779 046,48</b>	<b>35,98</b>	<b>7,08</b>



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ ТАЗИ ГИЗЗАТА» АГРЫЗСКИЙ РАЙОН





**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**  
**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**  
**МБОУ «САТЛАМЫШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ**  
**ШКОЛА» АПАСТОВСКИЙ РАЙОН**





# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

## КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ





# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

## ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.	СУММА, ТЫС.РУБЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	532	-
ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	16	435,0
- В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	6	-
ВЗЫСКАНО ВСЕГО	1	30,0
НЕ ИСТЕК СРОК ОПЛАТЫ	9	405,0



# **КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА** **ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО** **НАДЗОРА РТ**



**Жилой комплекс «Волжские просторы», г. Казань, Оренбургский тракт**



**Осуществление строительных работ без  
защитных средств (отсутствие каски)**

**Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на юридическое лицо**

**Застройщик: ООО «Березовая роща»**  
**Технический заказчик: ООО «#Суварстроит»**  
**Подрядчик: ООО «#Суварстроит»**



# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РТ



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
<b>ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК, В Т.Ч.:</b>	<b>648</b>
- С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА	339
<b>ПРИНЯТЫ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В Т.Ч.:</b>	<b>270</b>
- ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ	167
- ПРИОСТАНОВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО	21
- РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ СРО	25
- ВЫДАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ	56



# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

## ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ЕД.
КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК	375
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ	400
УСТРАНЕНО НАРУШЕНИЙ	394
СОСТАВЛЕНЫ ПРЕДПИСАНИЯ	111



# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

## ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
1	г.Казань	93	142	136	96
2	г.Набережные Челны	20	0	0	-
3	Агрызский	1	3	3	100
4	Азнакаевский	6	6	6	100
5	Аксубаевский	2	1	1	100
6	Актанышский	1	0	0	-
7	Алексеевский	18	5	5	100
8	Алькеевский	2	2	2	100
9	Альметьевский	25	45	45	100
10	Апастовский	9	11	11	100
11	Арский	5	0	0	-
12	Атнинский	3	2	2	100
13	Бавлинский	2	0	0	-
14	Балтасинский	-	-	-	-
15	Бугульминский	7	27	27	100
16	Буинский	5	2	2	100
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>375</b>	<b>400</b>	<b>394</b>	<b>98</b>



# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

## ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
17	Верхнеуслонский	11	8	8	100
18	Высокогорский	2	0	0	-
19	Дрожжановский	6	2	2	100
20	Елабужский	9	13	13	100
21	Заинский	-	-	-	-
22	Зеленодольский	20	18	18	100
23	Кайбицкий	7	9	9	100
24	Камско-Устьинский	4	0	0	-
25	Кукморский	4	2	2	100
26	Лайшевский	2	0	0	-
27	Лениногорский	6	13	13	100
28	Мамадышский	1	1	1	100
29	Менделеевский	-	-	-	-
30	Мензелинский	2	0	0	-
31	Муслюмовский	3	10	10	100
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>375</b>	<b>400</b>	<b>394</b>	<b>98</b>



# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

## ГКУ «ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РТ»



№	МО РТ	Количество проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	% устранения
32	Нижнекамский	31	35	35	100
33	Новошешминский	3	0	0	-
34	Нурлатский	4	4	4	100
35	Пестречинский	5	5	5	100
36	Рыбно-Слободский	1	0	0	-
37	Сабинский	9	0	0	-
38	Сармановский	6	18	18	100
39	Спасский	1	0	0	-
40	Тетюшский	15	0	0	-
41	Тукаевский	10	4	4	100
42	Тюлячинский	1	1	1	100
43	Черемшанский	8	9	9	100
44	Чистопольский	5	2	2	100
45	Ютазинский	-	-	-	-
<b>ВСЕГО по РТ</b>		<b>375</b>	<b>400</b>	<b>394</b>	<b>98</b>



# КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РТ



## «Чистая стройка» санитарно-экологический двухмесячник

Наименование	Количество
1. Проведено проверок	31
2. Выявлено нарушений	24
3. Составлено протоколов, в том числе:	24
на юридических лиц / на должностных лиц	7 / 17
4. Привлечено к административной ответственности, в том числе:	16
юридических лиц / должностных лиц	5 / 11
5. Наложено штрафов, тыс.руб.	315,0
6. Взыскано штрафов, тыс.руб.	200,0



# **КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА** **ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО** **НАДЗОРА РТ**



**Реконструкция поликлиники по ул.Халева, г.Казань**



**Не обеспечивается своевременный  
вывоз строительных отходов**

**Места сбора отходов  
не соответствуют нормам**

**Составлен протокол  
об административном правонарушении  
на юридическое лицо**

**Застройщик: Халилова Эльмира Касымовна**

**Технический заказчик: ООО «Стройинвест»**

**Подрядчик: ООО «БМП БРЕНДС ГРУП»**



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**
